



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

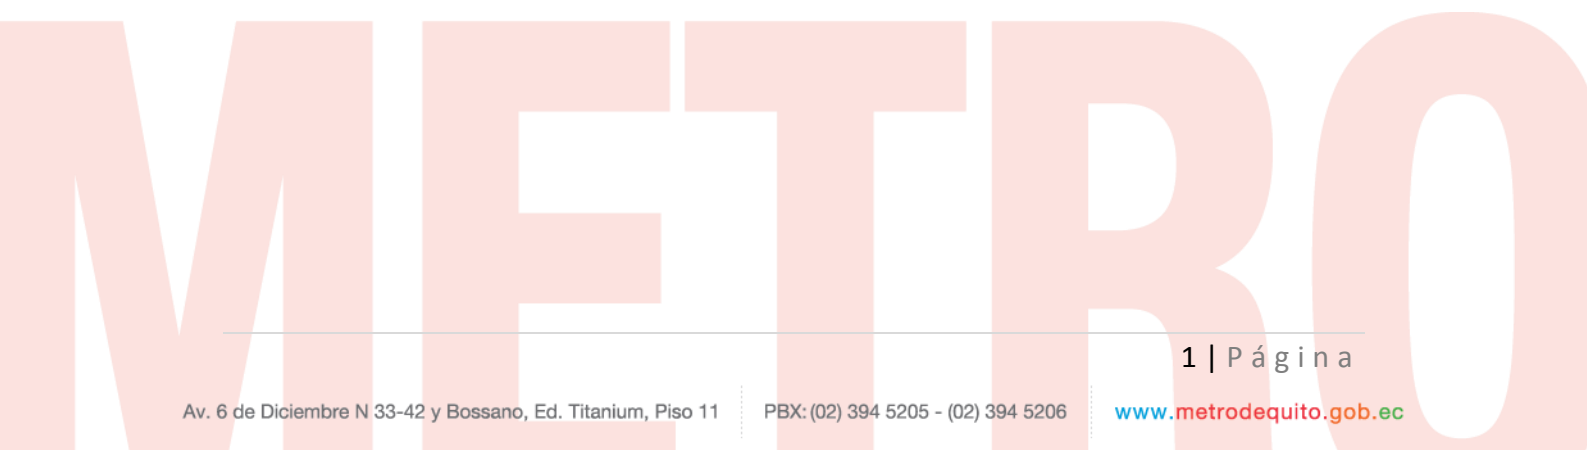

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	3
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.....	4
4. RENDICIÓN DE CUENTAS	5
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	7
6. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA	8
7. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	15
8. ENAJENACIÓN DE BIENES Y EXPROPIACIONES.....	16
9. INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES	17

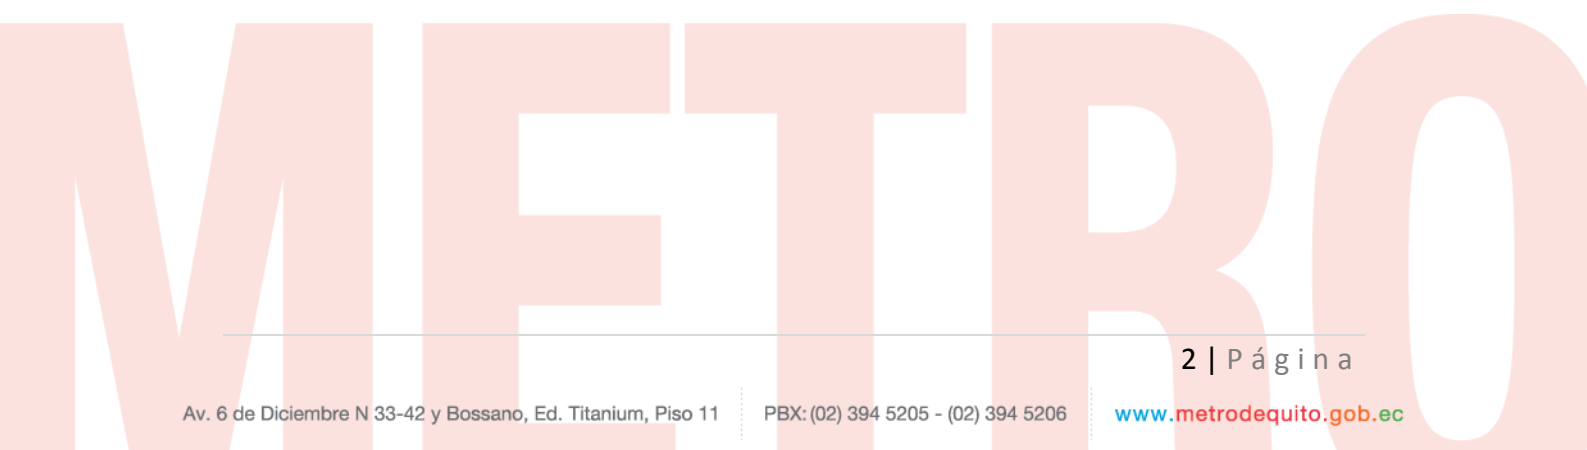

1. INTRODUCCIÓN

La agobiante congestión vehicular, el estrés social y la disminución de la productividad que se generan como consecuencia del exceso de tiempo utilizado para transportarse, han ocasionado un evidente deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Quito y se ha constituido en uno de los más agudos problemas de la urbe capitalina.

Frente a esta dramática realidad, la Municipalidad del DMQ ha resuelto emprender en el desarrollo de un gran proceso de modernización de la movilidad en la ciudad de Quito, que revierta esta tendencia y que a su vez se sustente en un sistema de transporte público integrado, sostenible, eficiente y con alto nivel de calidad en la prestación del servicio, de forma que no sólo recupere sino que mejore la calidad de vida de los quiteños y su nivel de productividad, con la conceptualización de un sistema integrado de transporte masivo para la ciudad de Quito, que incluya al Metro como su eje central y articulador.

En este sentido, se perfiló el proyecto Metro de Quito que recoge esta expectativa y que contempla el diseño e implementación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo para el DMQ (SITM), con el Metro como su eje articulador, que constituirá una oferta de transporte público moderno, eficiente, física y tarifariamente integrada, que actúe bajo la rectoría de una institución de carácter municipal que planifique, administre y controle el sistema de transporte, al amparo de un marco normativo adecuado.

El proyecto se concentra en la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se desarrollará en dos Fases:

- Fase 1: Construcción de las Estaciones El Labrador y La Magdalena, comprendiendo tanto las estaciones subterráneas del metro, como los intercambiadores (estaciones intermodales) en superficie y los edificios diseñados para estas 2 estaciones.
- Fase 2: Construcción de la Obra Civil del Túnel e implementación de las Instalaciones, construcción de las 13 estaciones restantes, cochera y talleres y adquisición del material móvil.

2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, cumple con las disposiciones legales de equidad de género y empleo a personas con discapacidad. Además el proyecto Primera Línea del Metro de Quito en cada una de las estaciones contempla facilidades (ascensores y escaleras eléctricas) para el acceso a personas con capacidad reducida.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:					
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Durante el 2014 no se han implementado mecanismos de participación ciudadana y control social, ya que la obra se encuentra en ejecución y la afectación a la comunidad ha sido mínima. De todas formas las obras de la Fase 1 del proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito fueron utilizadas como instrumento de aprendizaje para estudiantes universitarios y para que la ciudadanía conozca los avances de este proyecto tan importante para el país.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	ACCIONES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional	NO	N/A	N/A
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	N/A	N/A

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:			
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:			
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. ESCRIBA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Asamblea Local	NO	N/A	N/A
Audiencia pública	NO	N/A	N/A
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	N/A	N/A
Consejos Consultivos	NO	N/A	N/A
Diálogos Públicos de Deliberación.	NO	N/A	N/A
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía	NO	N/A	N/A
Otros (visitas guiadas)	SI	10	FOTOS

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:			
MECASNISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NUMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas	NO	N/A	N/A
Observatorios ciudadanos	NO	N/A	N/A
Defensorías comunitarias	NO	N/A	N/A
Comités de usuarios de servicios	NO	N/A	N/A
Otros	NO	N/A	N/A

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RENDICIÓN DE CUENTAS

El proceso de rendición de cuantas se muestra en el siguiente cuadro:

RENDICION DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas de la empresa	SI	CADA AREA ENTREGA LA INFORMACIÓN DE LA CUAL ES RESPONSABLE	N/A	-
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	SE TOMO LOS FORMULARIOS ESTABLECIDOS POR EL CPCS	FORMULARIO DE EMPRESAS PUBLICAS	Se cumple con las disposiciones dadas por el CPCS
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF)	SI	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A la fecha se presentó la liquidación presupuestaria del 2014 al Directorio. El Acta todavía no se encuentra aprobada
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas	SI	PUBLICADO EN LA WEB	INFORME PRELIMINAR	Llenado de información en las matrices

RENDICION DE CUENTAS					
	establecido por el CPCCS por la UDAF				
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	PUBLICADO EN LA WEB	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Llenado de información en las matrices
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	RECOPIACION DE INFORMACION ELABORADA POR CADA AREA	N/A	Los dueños de la información son responsables de la veracidad de la misma
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	PORTAL WEB	RENDICIÓN DE CUENTAS WEB	Informe preliminar publicada en la página web institucional
	Planificación de los eventos participativos	NO	N/A	N/A	-
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	EVENTO PÚBLICO REALIZADO	RENDICIÓN DE CUENTAS1	-
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	EVENTO PÚBLICO REALIZADO	RENDICIÓN DE CUENTAS2	El evento público se realizó el día 27 de julio de 2015
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	EVENTO PÚBLICO REALIZADO	RENDICIÓN DE CUENTAS3	El evento público se realizó en la Estación Intermodal El Labrador
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	PREGUNTAS AL FINAL DE LA PRESENTACIÓN DEL GERENTE GENERAL	N/A	Las principales dudas de la ciudadanía corresponde al inicio de la Fase 2
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	SE ENTREGA EN EL MES DE MARZO	-	Hubo un inconveniente al momento de subir la información, se enviará de forma física
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:					
La preocupación principal de la ciudadanía se debe al inicio de la Fase 2, se explicó que la empresa ha manejado los tiempos de la manera más adecuada y el principal problema se debe al desfase entre el presupuesto referencial y el de las ofertas, por lo que se requiere financiamiento por estos montos adicionales. Se está próximo a tomar una decisión al respecto.					

Ya que no hubo compromisos con la comunidad en la Rendición de Cuentas del año 2013, no se incluye información.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR		
CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Adicionalmente, la empresa no ha contratado la difusión y comunicación de la información en ningún medio de comunicación.

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prensa:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Televisión:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Medios digitales:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito ha dado cumplimiento a las directrices de la Defensoría del Pueblo y a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), que consiste en publicar en la página web institucional en el link “transparencia”, los literales correspondientes al artículo 7 de la LOTAIP.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.	SI	ART 7 LOTAIP ART 47 LOEP
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

6. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

6.1. METAS DEL POA 2014

CONTENIDOS ESPECÍFICOS	
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES POR LOS QUE LA CREÓ EL GAD	
FINES ASIGNADOS LEGALMENTE POR EL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FIN
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	Culminar con la construcción de la Fase 1 del Metro de Quito. (100% avance físico).
	Cumplir con el 100% de planillas aprobadas.
	100% de adecuaciones de escombreras programadas realizadas.
	80% de actividades programadas cumplidas, para la contratación de consultorías de apoyo.
	Transferencia al Fideicomiso de Titularización de \$13 millones provenientes de la participación del MDMQ en los ingresos del NAIQ.
	100% de actividades programadas cumplidas, en la expropiación de terrenos.
	80% de ejecución del Plan de Comunicación 2014.
	85% de ejecución en el presupuesto de personal y servicios administrativos

6.2. La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito tiene articulado el POA a las políticas públicas vigentes. El proyecto Primera Línea del Metro de Quito es considerado un proyecto prioritario tanto a nivel de Gobierno Central como Municipal.

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas.		
ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS		
ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
La institución tiene articuladas sus POA al PNBV	SI	PLAN DE DESARROLLO
El POA está articulado al PDOTE	SI	PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La institución tiene articulado su POA al Plan Maestro de Movilidad	SI	PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

6.3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014:

1. Obra Fase 1

Construcción de la Fase 1 del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito, el mismo que corresponde a las Estaciones Intermodales de El Labrador y La Magdalena, Fondo de Saco y la extensión de la Av. Isaac Albéniz.

Las estaciones intermodales incluyen:

- Estación Subterránea
- Intercambiador
- Edificio

CONSTRUCCION FASE 1

MES	% AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	% AVANCE DE OBRA EJECUTADO	% Cumplido
ENERO/DICIEMBRE 2014	57,61%	45,62%	79,19%

2013	42.39%	42,39%
-------------	---------------	---------------

TOTAL:	100,00%	88,01%
---------------	----------------	---------------

Para el 2014 se tenía planificado terminar en su totalidad las obras de construcción de Fase 1, las obras realizadas en este año representan 79,19% del total programado para el 2014, con un avance acumulado de obra del 88%.

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros durante las diferentes instancias de coordinación institucional con la EPMMQ y el Consorcio GMQ (Gerencia Técnica del Proyecto), ha expresado reiteradamente sus requerimientos de operatividad fundamentados en la disponibilidad de espacios, infraestructura y equipamiento para los intercambiadores de las estaciones intermodales de la Fase 1. El 11 de noviembre de 2014 se solicita oficialmente y concreta los cambios en el diseño de los edificios comunitarios de las estaciones La Magdalena y El Labrador, situación que obliga a realizar nuevos cálculos estructurales y de cimentación. Con este antecedente fue necesario firmar un contrato complementario N° 4 y el cual acuerda ampliar el plazo hasta el 30 de abril de 2015.

2. Fiscalización

Ejecución del contrato de Fiscalización Fase 1.

FISCALIZACIÓN FASE 1

MES	Cantidad de planillas programadas	Cantidad de planillas aprobadas	% Cumplido
ENERO/DICIEMBRE 2014	12,00	12,00	100%

- De enero a diciembre se ha cumplido el 100% de lo programado, sustentado con las planillas mensuales del mes cumplido.

3. Escombreras

Realización de trabajos de obra civil para reforzamiento de Escombreras.

ESCOBRERAS*

MES	E1	E2	% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA EJECUTADO	% Cumplido
NOVIEMBRE	100,00%	50,00%	75,00%	0,00%	0%
DICIEMBRE		50,00%	25,00%	0,00%	0%
TOTAL:	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

*NOTA: Esta actividad no se inicia

- **REHABILITACION ZAMBIZA:** Metro de Quito se haría cargo de la construcción de un muro, el cual se definió con la anterior administración de la EPMGIRS. Con el cambio de administración se indicó a Metro de Quito que la EPMGIRS se hará cargo de los trabajos en Zambiza y por tal razón esta rehabilitación no se ejecutó.
- **ESCOBRERA SAN PEDRO:** Esos trabajos planificados para iniciar en el mes de noviembre de 2014 y finalizar en febrero de 2015, al momento se encuentran en proceso de elaboración de Pliegos. Se estima que en el mes de enero se culminará el proceso de contratación y en el mes de abril estarán implementadas las obras de rehabilitación y cierre técnico de la escombrera.

4. Consultorías de Apoyo

Comprende la contratación de consultorías y asesorías, en estas se incluyen: consultorías, estudios, auditorías y capacitaciones.

En lo referente a Consultorías y Asesorías, las restantes 2 programadas para este año no se realizarán, ya que están relacionadas con diseños de escombreras que no se ejecutarán. Los estudios para la Escombrera Sibauco serán ejecutados por la EPMGIRS; los estudios de la Escombrera San José de Nayón están en ejecución, por lo que se han recibido dos productos, falta la recepción del tercer producto.

a. CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS

	Cumplidos	Pendientes	Cumplido / TOTAL
Cantidad de estudios programados	18,00		
Cantidad de Actas de Entrega Recepción de estudios	16,00	2,00	88,89%

b. AUDITORIAS Y CAPACITACIONES

	Entregados	Pendientes	% Cumplido
Cantidad de auditorías y capacitaciones programadas	3,00		
Cantidad de auditorías y capacitaciones terminadas	3,00	0,00	100%

En lo que corresponde a Ejecución de auditorías y capacitaciones, se debe indicar:

- Las capacitaciones se han realizado de acuerdo al plan de capacitación y a los requerimientos de la empresa.
- Auditoría Financiera: la Contraloría General del Estado, adjudicó a la empresa PKF para que realice la auditoría a los Estados Financieros de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito por el ejercicio económico 2013, la cual culminó en la primera semana de diciembre con la lectura del borrador del informe. El informe final se encuentra en proceso de aprobación por parte de la CGE.
- Auditoría Ambiental: La Auditoría Ambiental de Cumplimiento 2013-2014, se encuentra adjudicada a la empresa WHISTLER CIA LTDA. La consultoría fue entregada en los plazos previstos y se espera únicamente la aprobación del informe por parte del Ministerio del Ambiente.

5. Titularización de Flujos NAIQ

Corresponde a las transferencias al Fideicomiso de Titularización de los flujos trimestrales provenientes de la recaudación de tasas del Aeropuerto de Quito Mariscal Sucre (11% correspondiente al derecho del MDMQ).

Al 31 de diciembre fueron transferidos al Fideicomiso de Titularización la totalidad de fondos recibidos, los cuales corresponden al 98,70% del total programado para el presente año.

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NAIQ

MES	Total montos a transferir programados	Total montos transferidos	% Cumplido
FEBRERO	3.050.546,00	3.050.546,00	100%
MAYO	3.372.206,00	3.372.206,00	100%
AGOSTO	3.299.372,00	3.256.301,00	99%
NOVIEMBRE	3.801.136,00	3.668.161,00	97%
TOTAL:	13.523.260,00	13.347.214,00	98,70%

6. Expropiaciones

Procesos de expropiación de terrenos:

6.1. Terreno Empronorte (Isaac Albéniz):

Con fecha 20 de noviembre de 2014 se suscribe la escritura de Transferencia de Dominio por Expropiación otorgada por la Compañía EMPRONORTE OVERSEAS INC a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 73/100 (US \$ 2'237.335,73), valor acordado a pagar por el predio No.7720 con clave catastral 11805-02-007 de 2.898,00 metros cuadrados, ubicado en la parroquia Chaupicruz, corresponde al espacio requerido para ejecutar la prolongación de la Av. Isaac Albéniz.

6.2. Saldo a pagar por expropiación del terreno de la Cooperativa Alpallacta:

Con fecha 27 de octubre de 2014 la EPMMQ realiza la transferencia bancaria a favor de la Cooperativa de Vivienda Alpallacta por un valor de CUATRO MIL SESENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 44/100 (US \$. 4.067,44), por las edificaciones constantes en el predio antes mencionado; completando así con el proceso de expropiación correspondiente.

6.3. Terreno Cuerpo de Ingenieros del Ejército (La Magdalena):

Las partes convinieron en la suscripción de un convenio específico que permita cancelar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en concepto de indemnización por las edificaciones, instalaciones y obras civiles a la fecha existentes en el predio donde se construye la estación La Magdalena del proyecto Metro de Quito, el terreno se entrega en donación, en cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 1392 del 26 de diciembre de 2012, suscrito por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador.

Es importante señalar que este convenio específico hasta la presente fecha no ha sido suscrito; considerando que dentro del mismo debían definirse las condiciones para realizar el pago respectivo; como consecuencia no ha sido posible firmar la escritura pública entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Ministerio de Defensa Nacional a través de la cual se perfeccione la transferencia de dominio del bien inmueble. Por los antecedentes expuestos, no ha sido posible realizar el pago referente al terreno en cuestión.

EXPROPIACIONES DE TERRENOS

	Entregados	Pendientes	% Cumplido
Cantidad de transferencias de dominio de terrenos programados	3,00		
Cantidad de transferencias de dominio de terrenos ejecutadas	2,00	1,00	66,67%

7. Comunicación y Publicidad

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

MES	Cantidad de actividades de comunicación programadas	Cantidad de actividades de comunicación ejecutadas	% Cumplido
ENERO/DICIEMBRE 2014	11,00	11,00	100%

La ejecución del Plan de comunicación del 2014 se ha cumplido a través de las siguientes actividades:

- Definición y desarrollo de la línea argumental de Metro de Quito, bajo la metodología de caja de mensajes.
- Selección y entrenamiento del vocero oficial de Metro de Quito.
- Durante el trimestre final de 2014, la Dirección de Comunicación centró sus actividades en el fortalecimiento de la relación con medios de comunicación y públicos estratégicos de Metro de Quito.
- Se ha trabajado en el monitoreo a detalle de medios online y offline para definir la curva de información de Metro de Quito.
- Se desarrolló la nueva imagen gráfica de Metro de Quito, de acuerdo a los parámetros definidos por la Secretaría de Comunicación del DMQ.

8. Gestión Administrativa

Se miden dos indicadores de ejecución: **a.** Gastos de Personal y **b.** Gastos Administrativos Varios.

GASTOS DE PERSONAL

MES	Monto de presupuesto asignado	Monto de presupuesto comprometido	% Cumplido
DICIEMBRE	1.699.463,82	1.604.929,39	94,44%

GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS

MES	Monto de presupuesto asignado	Monto de presupuesto comprometido	% Cumplido
DICIEMBRE	684.349,41	527.845,86	77,13%

Se cumplieron con todas las actividades planificadas de la gestión administrativa en cuanto a gastos de personal y gastos varios, con porcentajes adecuados de cumplimiento de metas al 2014 al obtener en promedio global del 89,47% de valores comprometidos en la Gestión Administrativa.

TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MES	Monto de presupuesto asignado	Monto de presupuesto comprometido	% Cumplido
DICIEMBRE	2.383.813,23	2.132.775,25	89,47%

Adicionalmente cabe mencionar que el presupuesto general de la empresa cierra el año con una ejecución del 95,59% comprometido y 87,26% devengado.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Obras Fase 1: Culminar con la construcción de la Fase 1 del Metro de Quito.	% de avance físico de la Fase 1.	57,6%	45,6%	79,19%	57.591.778,93	51.597.237,05	89,6%	LITERAL K) LOTAIP EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
2	Fiscalización: Cumplir con la aprobación mensual de planillas	Cantidad de planillas aprobadas / cantidad de planillas programadas.	100,0%	100,0%	100,00%	2.477.156,94	1.817.527,72	73,4%	
3	Escombreras: Adecuaciones de escombreras programadas realizadas.	% de avance físico en adecuación de escombreras.	100,0%	0,0%	0,00%	256.000,00	0,00	0,0%	
4	Consultorías de apoyo: Estudios finalizados.	Cantidad de consultorías, estudios, auditorías y capacitaciones / Cantidad de consultorías, estudios, auditorías y capacitaciones programadas.	80,0%	88,9%	111,11%	1.049.975,18	688.867,61	65,6%	
5	Transferencia al Fideicomiso de Titularización de \$13 millones provenientes de la participación del MDMQ en los ingresos del NAIQ.	Total montos transferidos / Total montos a transferir programados.	100,0%	98,7%	98,70%	13.523.260,00	13.347.214,00	98,7%	
6	Expropiaciones: 100% de actividades programadas cumplidas.	Cantidad de procesos jurídicos de expropiación cumplidos / Cantidad de procesos jurídicos de expropiación programados.	100,0%	66,7%	66,67%	4.934.694,73	2.241.403,17	45,4%	
7	Comunicación y publicidad: Ejecución del Plan de Comunicación 2014.	Cantidad de actividades de comunicación ejecutadas / Cantidad de actividades de comunicación programadas.	80,0%	100,0%	125,00%	260.000,00	164.783,76	63,4%	
8	Gestión Administrativa: Ejecución en el presupuesto de personal y servicios administrativos	Monto de presupuesto comprometido / Monto de presupuesto asignado.	2.383.813,23	2.132.775,25	89,47%	2.383.813,23	2.115.473,30	88,7%	

6.4. INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		
BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	\$ 10.971.615,70	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2014
PASIVOS	(\$ 305.772,13)	
PATRIMONIO	(\$ 10.665.843,57)	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	82.476.679,01	71.972.506,61	87,3%	LITERAL G) LOTAIP EN PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
TOTAL	82.476.679,01	71.972.506,61	87,3%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
82.476.679,01	0,00	0,00	82.476.679,01	71.972.506,61

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de Relaciones Laborales
Tributarias	X	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones

7. PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Durante el 2014 se adjudicaron un total de 263 contratos por un monto total de \$465.174,61, de los cuales 260 contratos finalizaron durante el 2014 por un monto total de \$400.282,62. Adicionalmente durante el 2014 se adjudicó al Consorcio CAF Metro de Quito la adquisición y financiamiento del material móvil por US\$ 183.592.999,00; que de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 383, el contrato será celebrado por el

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito tendrá a su cargo la administración del contrato.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	254	\$ 173.415,92	254	\$ 173.415,92	LITERAL I) LOTAIP EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL
Publicación	-	-	-	-	
Licitación	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	-	-	-	-	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	4	\$ 166.866,70	4	\$ 166.866,70	
Menor Cuantía	-	-	-	-	
Lista corta	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consultoría	-	-	-	-	
Régimen Especial	4	\$ 105.321,43	2	\$ 60.000,00	
Catálogo Electrónico	-	-	-	-	
Cotización	-	-	-	-	
Ferías Inclusivas	-	-	-	-	
Otras	1	\$ 19.570,56	-	-	

8. ENAJENACIÓN DE BIENES Y EXPROPIACIONES

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito no ha realizado ningún trámite por enajenación de bienes; y en lo referente a expropiaciones se explica en el acápite 6.3 Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2014.

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
TERRENO EMPRONORTE	\$ 2.237.335,73	INFORME EXPROPIACIONES
COOP. ALPALLACTA	\$ 4.067,44	
TERRENO CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO LA MAGDALENA	PENDIENTE	

9. INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito no ha recibido recomendaciones por parte de las entidades de transparencia y control social para que sean incorporadas dentro de la gestión.

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MAURICIO ANDERSON
GERENTE GENERAL
Metro de Quito- EPM
